LE GESTIONNAIRE™

Aperçu du logiciel

Les avenants p.1
Avenants rapports p.2
Bon de commande p.3
Échéancier p.4
Mémo d'intention p.5
Rapport d'échéance p.6

Systèmes PGIR INC.

Les avenants

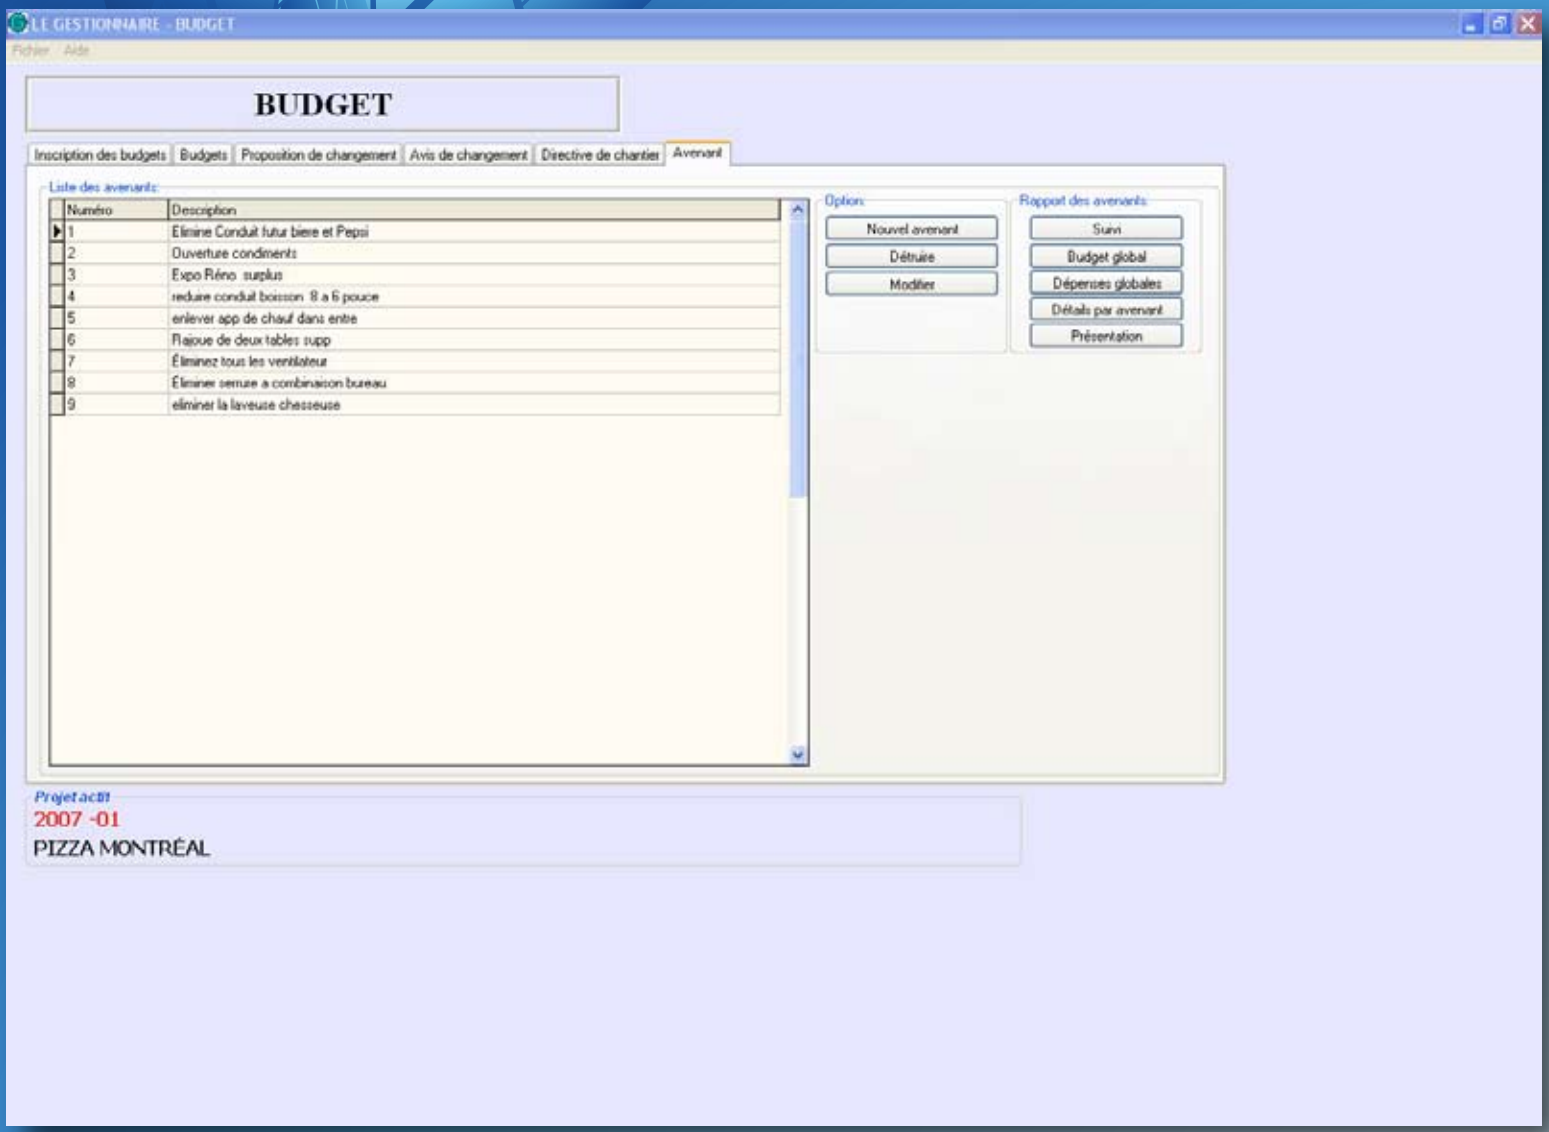

Retour index

Avenants rapports

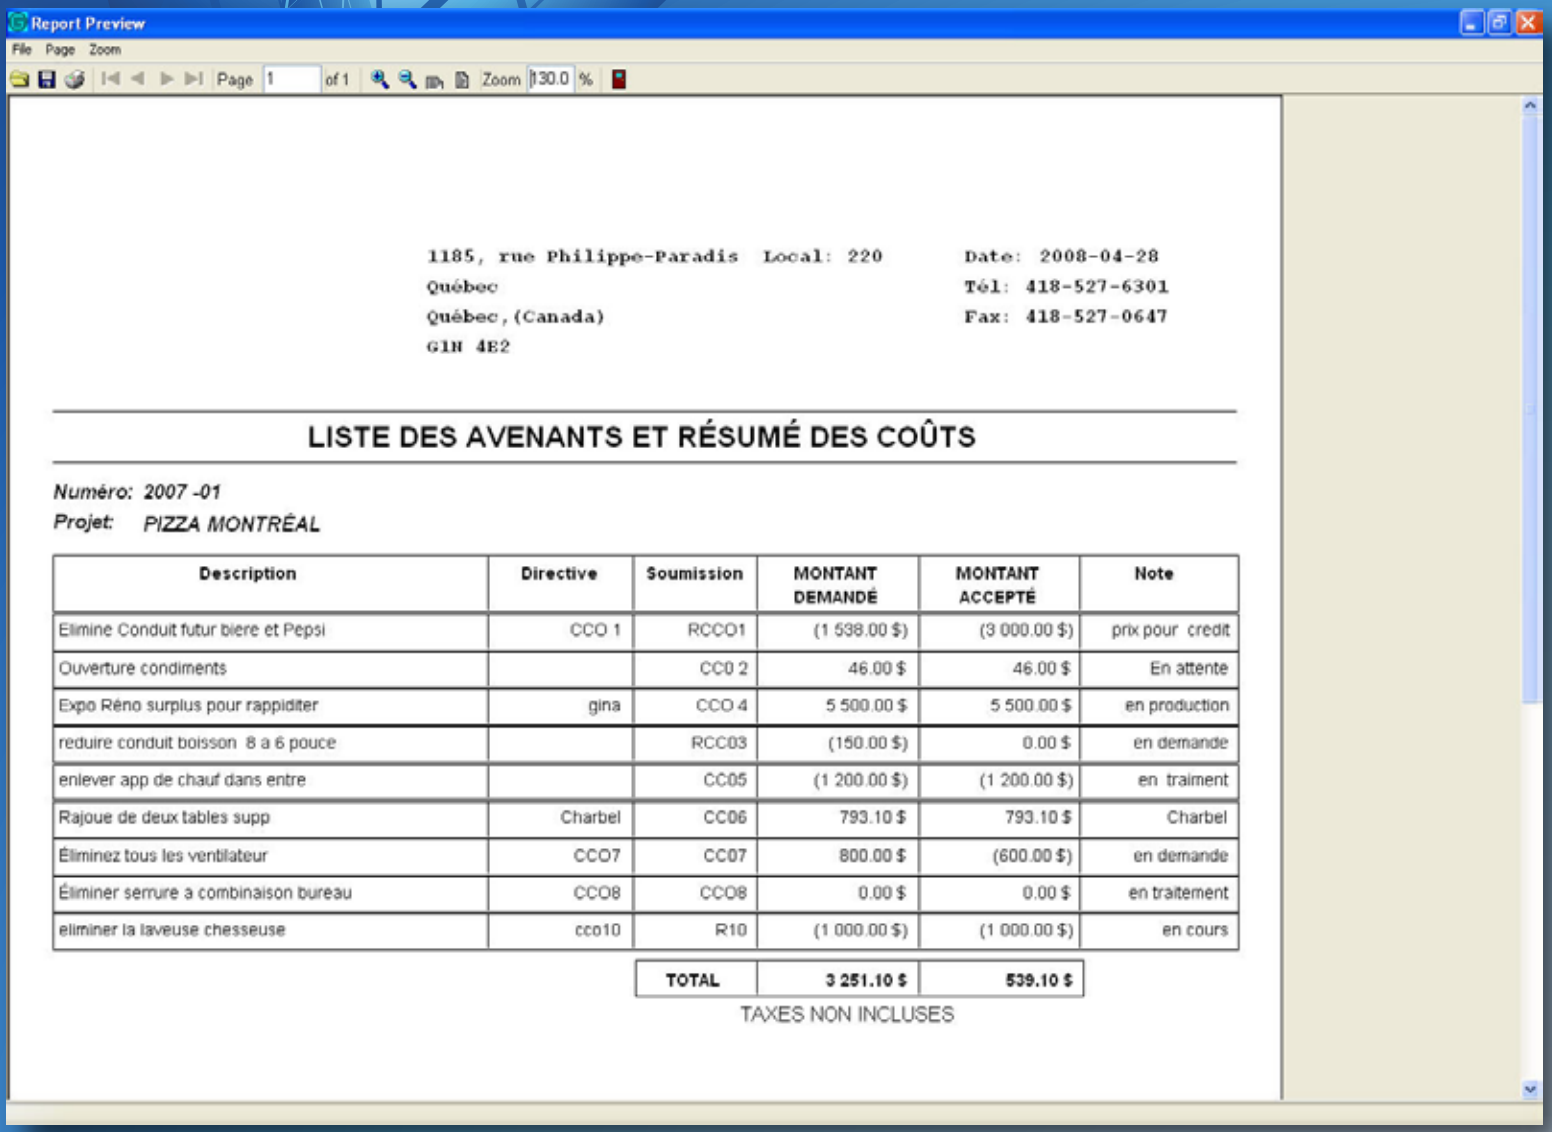

1185, rue Philippe-Paradis Local: 220
Québec
Québec,(Canada)
G1N 4E2

Date: 2008-04-28
Tél: 418-527-6301
Fax: 418-527-0647

LISTE DES AVENANTS ET RÉSUMÉ DES COÛTS

Numéro: *2007 -01*
Projet: *PIZZA MONTRÉAL*

Description	Directive	Soumission	MONTANT DEMANDÉ	MONTANT ACCEPTÉ	Note
Elimine Conduit futur biere et Pepsi	CCO 1	RCCO1	(1 538.00 $)	(3 000.00 $)	prix pour credit
Ouverture condiments		CC0 2	46.00 $	46.00 $	En attente
Expo Réno surplus pour rappiditer	gina	CCO 4	5 500.00 $	5 500.00 $	en production
reduire conduit boisson 8 a 6 pouce		RCC03	(150.00 $)	0.00 $	en demande
enlever app de chauf dans entre		CC05	(1 200.00 $)	(1 200.00 $)	en traiment
Rajoue de deux tables supp	Charbel	CC06	793.10 $	793.10 $	Charbel
Éliminez tous les ventilateur	CCO7	CC07	800.00 $	(600.00 $)	en demande
Éliminer serrure a combinaison bureau	CCO8	CCO8	0.00 $	0.00 $	en traitement
eliminer la laveuse chesseuse	cco10	R10	(1 000.00 $)	(1 000.00 $)	en cours
		TOTAL	**3 251.10 $**	**539.10 $**	

TAXES NON INCLUSES

Retour index

Bon de commande

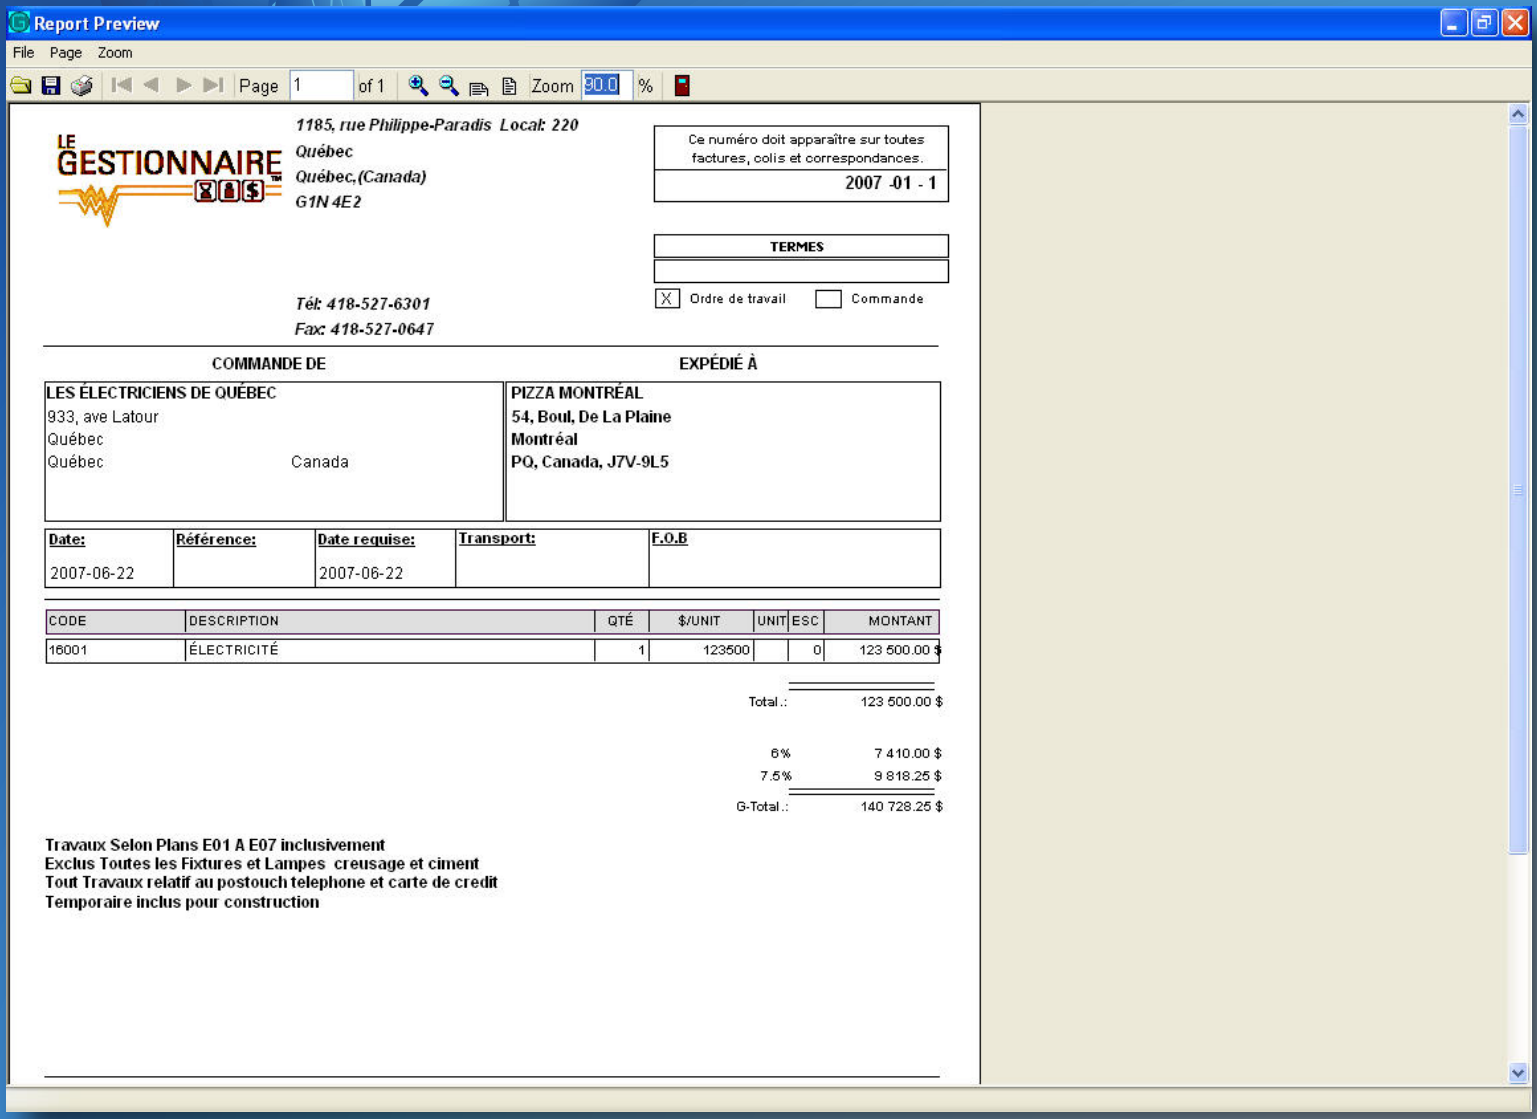

Retour index

Échéancier

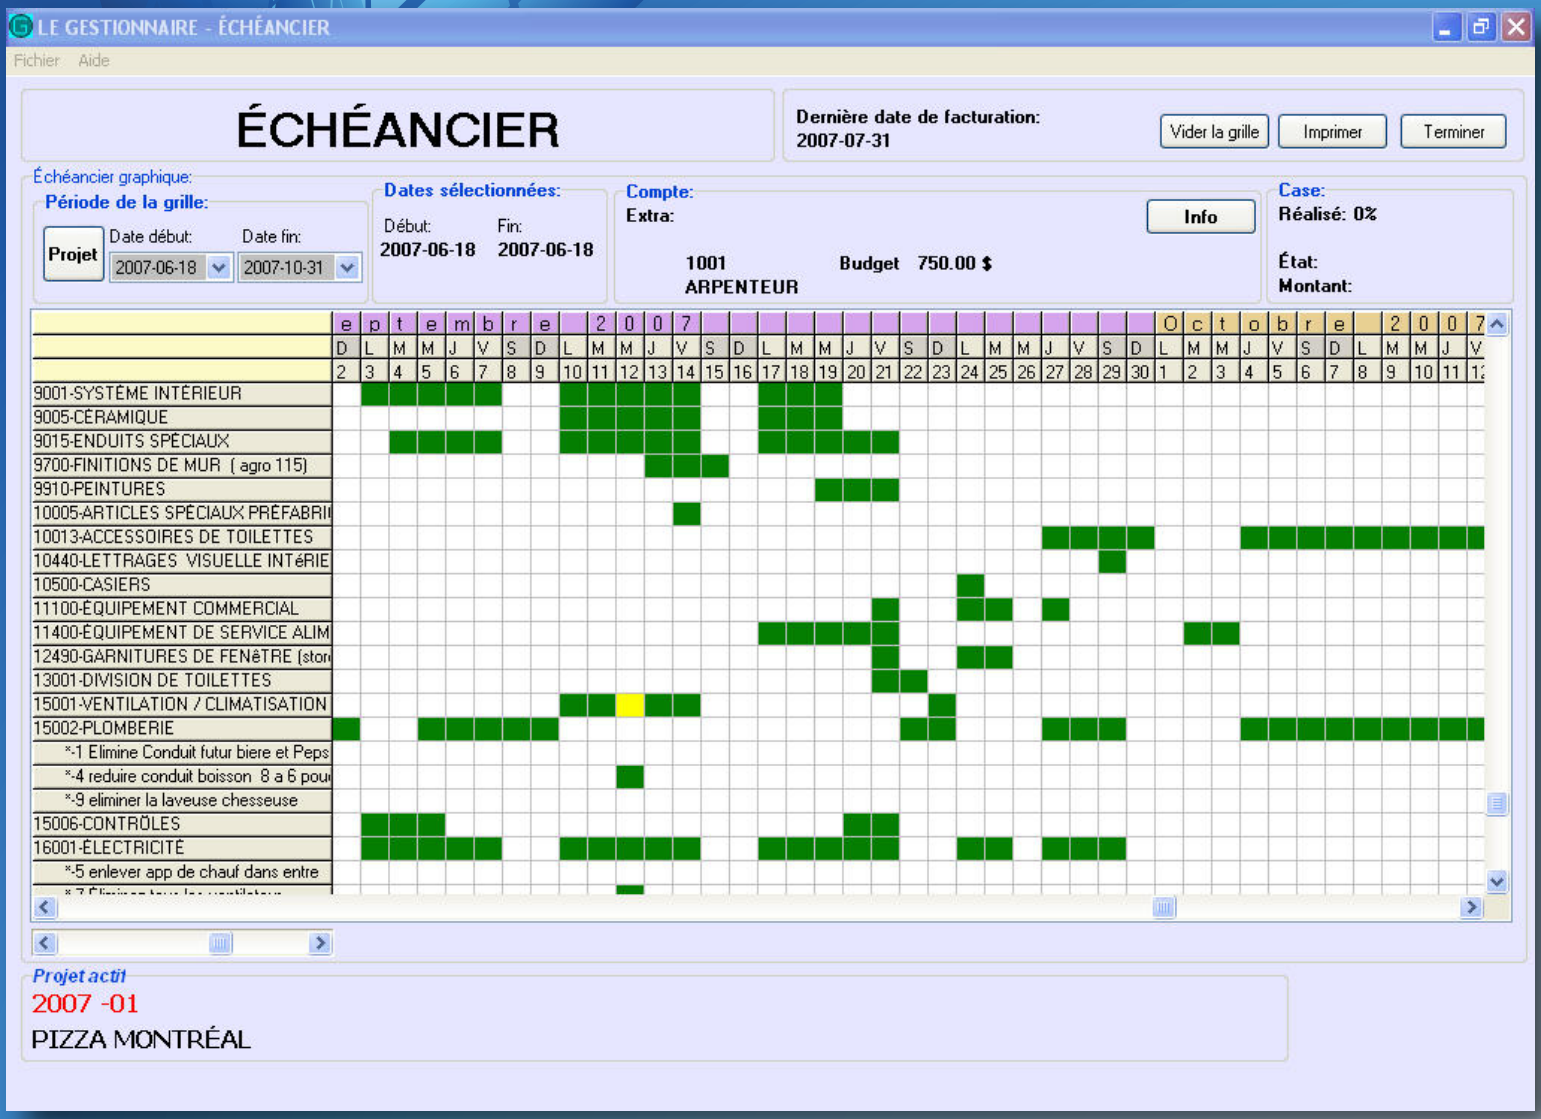

Retour index

Mémo d'intention

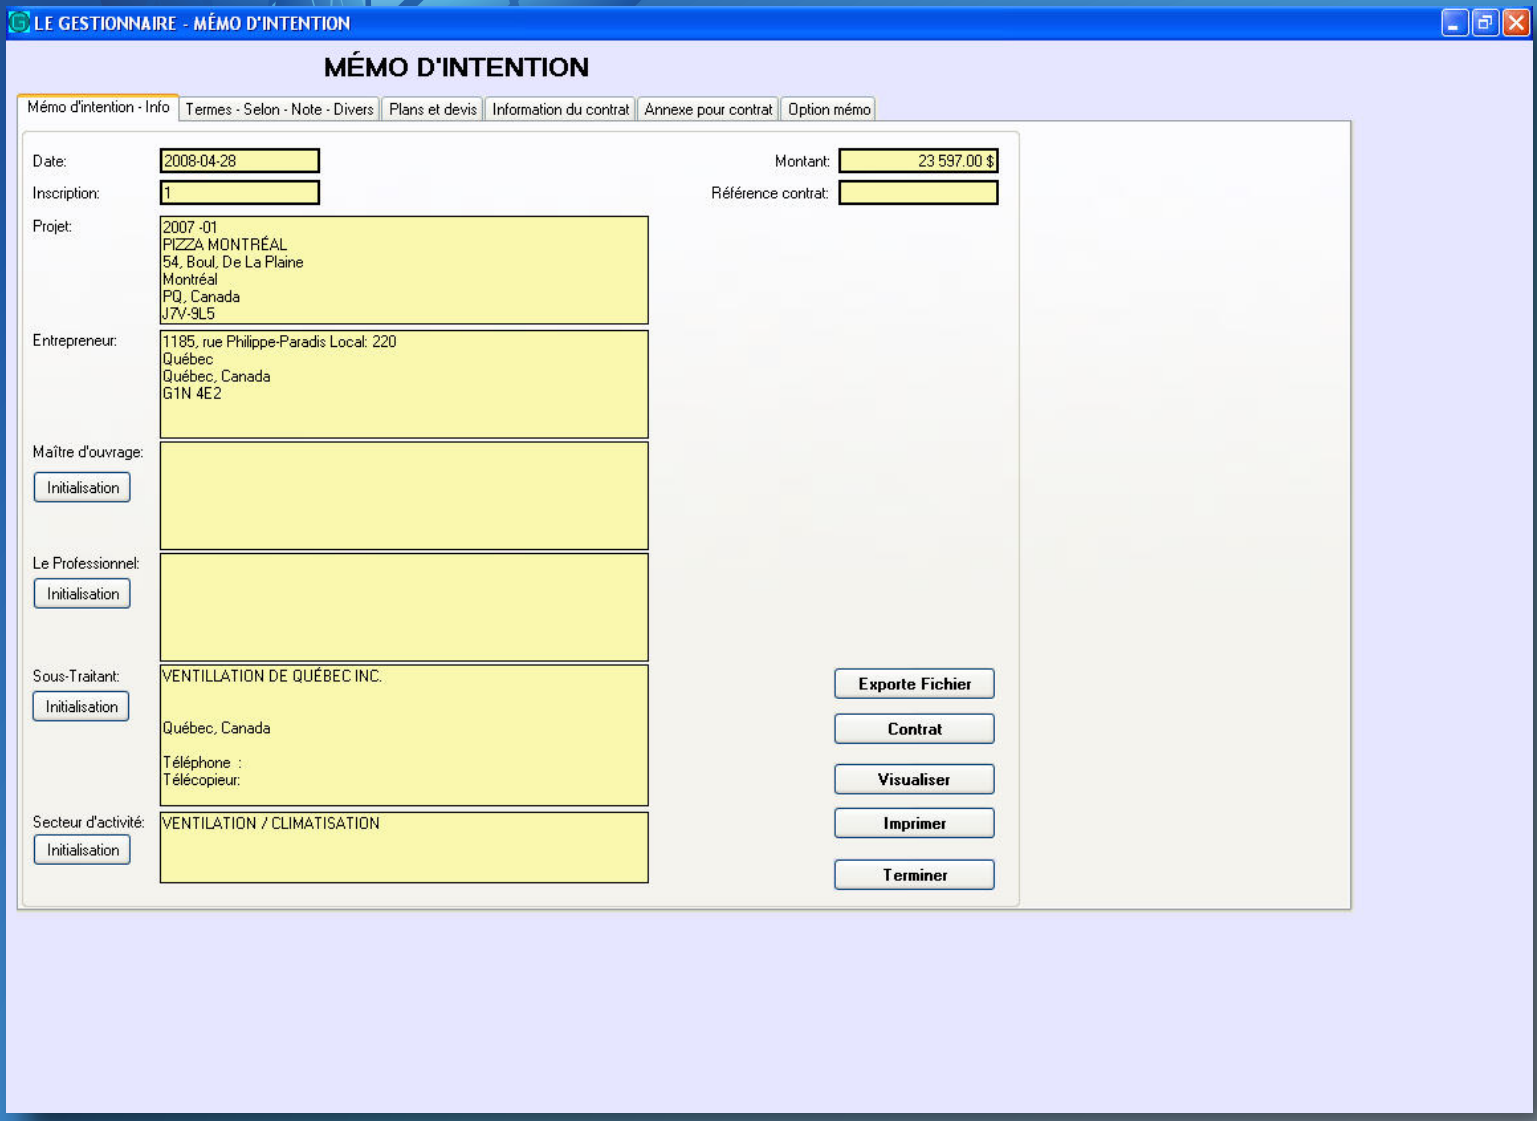

Retour index

Rapport d'échéance

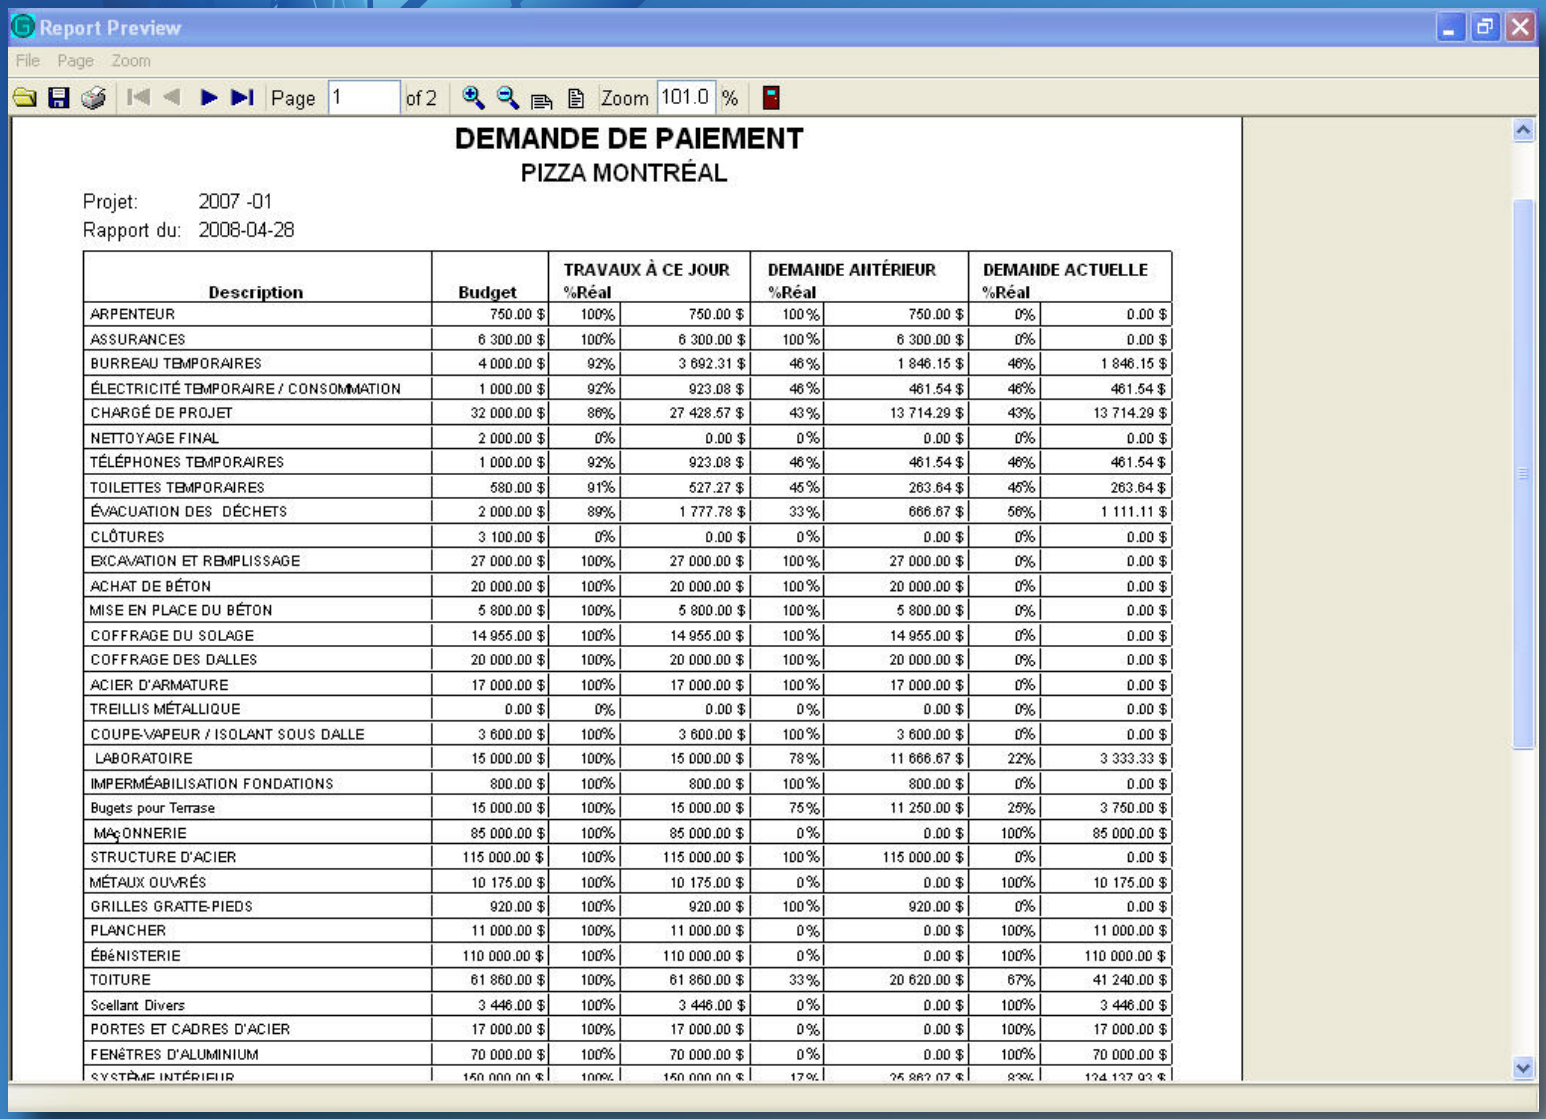

DEMANDE DE PAIEMENT

PIZZA MONTRÉAL

Projet: 2007 -01

Rapport du: 2008-04-28

Description	Budget	TRAVAUX À CE JOUR %Réal		DEMANDE ANTÉRIEUR %Réal		DEMANDE ACTUELLE %Réal	
ARPENTEUR	750.00 $	100%	750.00 $	100%	750.00 $	0%	0.00 $
ASSURANCES	6 300.00 $	100%	6 300.00 $	100%	6 300.00 $	0%	0.00 $
BURREAU TEMPORAIRES	4 000.00 $	92%	3 692.31 $	46%	1 846.15 $	46%	1 846.15 $
ÉLECTRICITÉ TEMPORAIRE / CONSOMMATION	1 000.00 $	92%	923.08 $	46%	461.54 $	46%	461.54 $
CHARGÉ DE PROJET	32 000.00 $	86%	27 428.57 $	43%	13 714.29 $	43%	13 714.29 $
NETTOYAGE FINAL	2 000.00 $	0%	0.00 $	0%	0.00 $	0%	0.00 $
TÉLÉPHONES TEMPORAIRES	1 000.00 $	92%	923.08 $	46%	461.54 $	46%	461.54 $
TOILETTES TEMPORAIRES	580.00 $	91%	527.27 $	45%	263.64 $	46%	263.64 $
ÉVACUATION DES DÉCHETS	2 000.00 $	89%	1 777.78 $	33%	666.67 $	56%	1 111.11 $
CLÔTURES	3 100.00 $	0%	0.00 $	0%	0.00 $	0%	0.00 $
EXCAVATION ET REMPLISSAGE	27 000.00 $	100%	27 000.00 $	100%	27 000.00 $	0%	0.00 $
ACHAT DE BÉTON	20 000.00 $	100%	20 000.00 $	100%	20 000.00 $	0%	0.00 $
MISE EN PLACE DU BÉTON	5 800.00 $	100%	5 800.00 $	100%	5 800.00 $	0%	0.00 $
COFFRAGE DU SOLAGE	14 955.00 $	100%	14 955.00 $	100%	14 955.00 $	0%	0.00 $
COFFRAGE DES DALLES	20 000.00 $	100%	20 000.00 $	100%	20 000.00 $	0%	0.00 $
ACIER D'ARMATURE	17 000.00 $	100%	17 000.00 $	100%	17 000.00 $	0%	0.00 $
TREILLIS MÉTALLIQUE	0.00 $	0%	0.00 $	0%	0.00 $	0%	0.00 $
COUPE-VAPEUR / ISOLANT SOUS DALLE	3 600.00 $	100%	3 600.00 $	100%	3 600.00 $	0%	0.00 $
LABORATOIRE	15 000.00 $	100%	15 000.00 $	78%	11 666.67 $	22%	3 333.33 $
IMPERMÉABILISATION FONDATIONS	800.00 $	100%	800.00 $	100%	800.00 $	0%	0.00 $
Bugets pour Terrase	15 000.00 $	100%	15 000.00 $	75%	11 250.00 $	25%	3 750.00 $
MAçONNERIE	85 000.00 $	100%	85 000.00 $	0%	0.00 $	100%	85 000.00 $
STRUCTURE D'ACIER	115 000.00 $	100%	115 000.00 $	100%	115 000.00 $	0%	0.00 $
MÉTAUX OUVRÉS	10 175.00 $	100%	10 175.00 $	0%	0.00 $	100%	10 175.00 $
GRILLES GRATTE-PIEDS	920.00 $	100%	920.00 $	100%	920.00 $	0%	0.00 $
PLANCHER	11 000.00 $	100%	11 000.00 $	0%	0.00 $	100%	11 000.00 $
ÉBéNISTERIE	110 000.00 $	100%	110 000.00 $	0%	0.00 $	100%	110 000.00 $
TOITURE	61 860.00 $	100%	61 860.00 $	33%	20 620.00 $	67%	41 240.00 $
Scellant Divers	3 446.00 $	100%	3 446.00 $	0%	0.00 $	100%	3 446.00 $
PORTES ET CADRES D'ACIER	17 000.00 $	100%	17 000.00 $	0%	0.00 $	100%	17 000.00 $
FENêTRES D'ALUMINIUM	70 000.00 $	100%	70 000.00 $	0%	0.00 $	100%	70 000.00 $
SYSTÈME INTÉRIEUR	150 000.00 $	100%	150 000.00 $	17%	25 862.07 $	83%	124 137.93 $

Retour index
